


MUNICIPIO DE CABUYARO			No. Contrato: 020 de 2010			Foro de Inicio: 16/06/2011	
Objeto del Contrato	Estudios diseños y construcción del centro deportivo y del centro cultural para las instituciones educativas del municipio de Cabuyaro, Meta.		Alcance del contrato		Polideportivo multifuncional, cancha de futbol sintética, graderías cubiertas. En el centro cultural se construirá un bloque de dos niveles con recepción, el área de danza, un aula virtual, administración, cuarto de equipos y almacén. En la segunda planta se ubicará talleres de maderas, orfebrería, pintura y galería sala múltiple.		
			No. Beneficiarios		3.916 habitantes		
CONTRATISTA							
Nombre	Unión Temporal Cecude Cabuyaro		Representante Legal		Daniel Arturo Sánchez Gutiérrez		
FECHA							
Inicio	01/02/11	Suscripción	30/12/10	Terminación	01/12/11	Plazo Inicial	10 meses
						Plazo Total	10 meses
VALOR CONTRATADO (MILLONES)							
Inicial	\$5.497	Total	\$5.497	Financiados regalías		\$5.497	
Ejecución financiera		50%		Ejecución física		52%	
INTERVENTORÍA				SUPERVISOR			
Nombre	Consorcio Orión 11 Germán Duran Antolinez			Nombre	Lucio Daza		
Monto	\$412 Millones			Cargo	Secretario de Planeación Municipal		

# ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO Y DEL CENTRO CULTURAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CABUYARO, META.

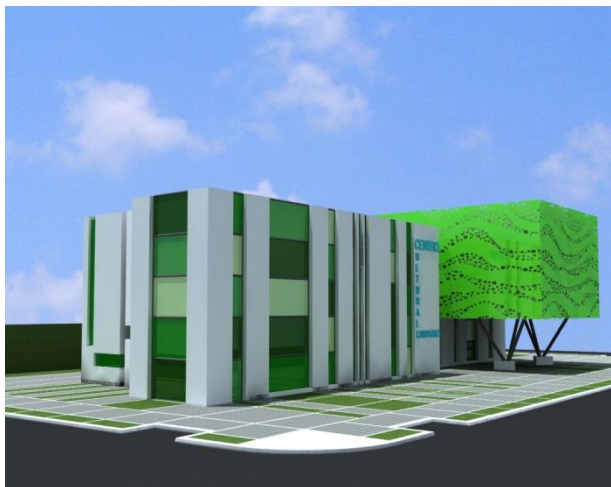

<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$5.497 Millones (Regalías Directas)
<b>FORO DE INICIO</b>	16/06/2011
<b>ASISTENTES</b>	77 personas.
<b>RESPONSABLE</b>	DNP
<b>BENEFICIARIOS</b>	3,916 habitantes

## RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

### Compromisos :

- Socializar con la comunidad el alcance general del contrato en menos de 30 días de realizada esta auditoria, para lo cual la Administración municipal hará la convocatoria y enviar actas a la IAF. En Proceso.
- La administración Municipal se compromete asumir los gastos de administración y funcionamiento del centro cultural y del polideportivo. En proceso.

## ESTADO ACTUAL

En ejecución.
