

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	CONTRATO DE OBRA NO. 02 DE 2010	FORO DE SEGUIMIENTO 30/09/2010
--------------------------------	--	---

Proyecto	Construcción y adecuación de ambientes escolares en las instituciones y centros educativos del municipio de Chiriguana - Departamento del Cesar	Alcance del contrato	Adecuación de 19 Instituciones educativas ubicadas en la zona rural y urbana del Municipio de Chiriguana - César
-----------------	---	-----------------------------	--

CONTRATISTA

Nombre	CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	Representante legal	DAVID OROZCO MALDONADO
---------------	---	----------------------------	------------------------

FECHA

Inicio	08/02/ 2010	Suscripción	20/01/2010	Terminación	23/12/2011	Plazo Inicial	12 MESES
						Plazo Total	22 MESES


VALOR CONTRATADO (MILLONES)

Inicial	\$17.941	Total	\$ 17.941	Financiados regalías	\$ 17.941
Ejecución financiera		76%		Ejecución física	58%

INTERVENTORÍA			SUPERVISIÓN		
----------------------	--	--	--------------------	--	--

Nombre	Unión Temporal Infraestructura Educativa	Nombre	Luis Rafael Rocha
Monto	\$ 1.344	Cargo	Secretario de Planeación Municipal

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

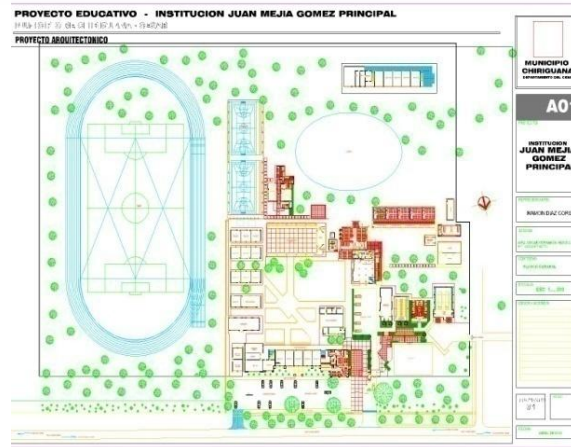


VALOR DEL PROYECTO	\$ 17.941 Millones Regalías directas
FORO DE INICIO	19/05/10
ASISTENTES	70 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	7.183 Estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- Realizar una socialización específicamente con la comunidad educativa, rectores, docentes, asociaciones de padres de familia, consejos directivos de los colegios y estudiantes.
- Incluir la representación de los Rectores en el Comité de Obra para que estén informados de las decisiones de índole técnico y financiero.
- Enviar a la IAF del DNP el Informe de la Interventoría Técnica, que incluye el detalle del inventario infraestructura actual para adecuar.
- El Contratista informa que el enganche de personal se realizará a través de los Rectores teniendo en cuenta la idoneidad del mismo, y adoptará medidas para asegurar el cumplimiento en pagos a los empleos directos e indirectos del Municipio de Chiriguaná.

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

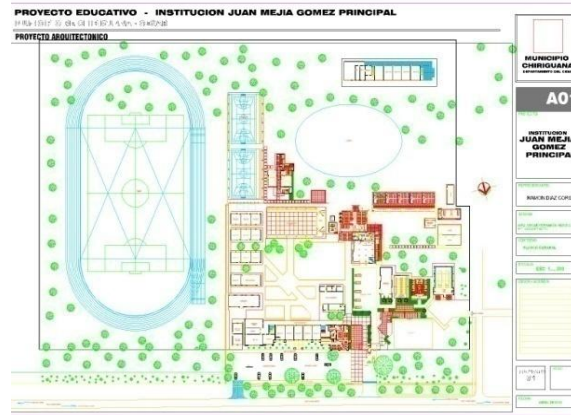

VALOR DEL PROYECTO	\$ 17.941 Millones Regalías directas
FORO DE SEGUIMIENTO	30/09/2010
ASISTENTES	35 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	7.183 Estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- La Supervisión verificará que la Interventoría Técnica cumpla con la presencia permanente en la obra.
- La Administración Municipal realizarán la socialización del proyecto en Santa Rita y La Sierra. (Compromiso cumplido)
- El DNP enviará al Comité de beneficiarios los compromisos escaneados la primera semana de Octubre.
- La Interventoría Técnica verificará de manera constante el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, garantizando que todos sin excepción usen la dotación.
- La Administración Municipal entregará al DNP los diseños finales de cada una de las sedes a intervenir el miércoles 6 de octubre.

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.



VALOR DEL PROYECTO	\$ 17.941 Millones
FORO DE SEGUIMIENTO	Agosto 26 de 2011
ASISTENTES	76 personas.
RESPONSABLE	DNP
BENEFICIARIOS	7.183 Estudiantes

RESULTADOS DE LA AUDITORIA VISIBLE

Compromisos:

- El contratista entregará el detalle de las obras reparadas en la Institución Educativa Argote Sede B 2 de septiembre. En proceso.
- El contratista entregará finalizada la I.E Santa Rita el 15 de septiembre. En proceso.
- El Municipio buscará resolver el problema de suministro de agua en la I.E Argote Vega Sede 3, antes del 15 de septiembre. En proceso.
- El Municipio informará al DNP, el 2 de septiembre la ubicación final del comedor escolar. Cumplido.
- El Municipio entregará al DNP el 30 e agosto, el cronograma ajustado, el plan de contingencia, los soportes de notificación de las acciones iniciadas al contratista respecto a los posibles incumplimientos. En proceso.

ESTADO DEL PROYECTO

En ejecución, presenta un retraso del 22%.
